


Proyecto: Cronograma de avance de c
Fecha: ma 25/01/05



Id	Nombre de tarea	Duración	04 abr '99	11 abr '99	18 abr '99	25 abr '99	02 may '99	09 may '99	16 may '99	23 may '99	30 may '99	06 jun '99	13 jun '99	20 jun '99
			04/04	11/04	18/04	25/04	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06	13/06	20/06
24	Techo : encofrado y a	6 días												
25	instalaciones empotra	2 días												
26	Vaciado	1 día												
27	Desencofrado	3 días												
28	Techo 1er. Piso	20 días												
29	Muros, columnas y pl	4 días												
30	Instalaciones empotra	1 día												
31	Vaciado	1 día												
32	Desencofrado	3 días												
33	Techo : encofrado y a	6 días												
34	Instalaciones empotra	1 día												
35	Vaciado	1 día												
36	Desencofrado	3 días												
37	Techo 2do. Piso	20 días												
38	Muros y columnas : er	4 días												
39	Instalaciones empotra	1 día												
40	Vaciado	1 día												
41	Desencofrado	3 días												
42	Techo : encofrado arn	6 días												
43	Instalaciones empotra	1 día												
44	Vaciado	1 día												
45	Desencofrado	3 días												
46	Techo 3er. Piso	20 días												

Proyecto: Cronograma de avance de c
Fecha: ma 25/01/05



Id	Nombre de tarea	Duración	04 abr '99	11 abr '99	18 abr '99	25 abr '99	02 may '99	09 may '99	16 may '99	23 may '99	30 may '99	06 jun '99	13 jun '99	20 jun '99
			04/04	11/04	18/04	25/04	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06	13/06	20/06
47	Muros y columnas : er	4 días												
48	Instalaciones empotra	1 día												
49	Vaciado	1 día												
50	Desencofrado	3 días												
51	Techo : encofrado y a	6 días												
52	Instalaciones empotra	1 día												
53	Vaciado	1 día												
54	Desencofrado	3 días												
55	Techo 4to. Piso	20 días												
56	Muros y columnas : er	4 días												
57	Instalaciones empotra	1 día												
58	Vaciado	1 día												
59	Desencofrado	3 días												
60	Techo : encofrado arn	6 días												
61	Instalaciones empotra	1 día												
62	Vaciado	1 día												
63	Desencofrado	3 días												
64	Tanque elevado	9 días												
65	Muros y columnas : er	2 días												
66	Instalaciones empotra	1 día												
67	Vaciado	1 día												
68	Desencofrado	1 día												
69	Fondo y techo : encof	1 día												

Proyecto: Cronograma de avance de c
Fecha: ma 25/01/05

Tarea



Resumen



Progreso resumido



Tarea crítica



Tarea resumida



División



Progreso



Tarea crítica resumida



Tareas externas



Hito




Hito resumido



Resumen del proyecto




Id	Nombre de tarea	Duración	04 abr '99	11 abr '99	18 abr '99	25 abr '99	02 may '99	09 may '99	16 may '99	23 may '99	30 may '99	06 jun '99	13 jun '99	20 jun '99
			04/04	11/04	18/04	25/04	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06	13/06	20/06
70	Instalaciones empotra	1 día												
71	Vaciado	1 día												
72	Desencofrado	1 día												
73	Cielorrasos	71 días												
74	Cielorraso en sótano	2 días												
75	Cielorraso en techo 1º	3 días												
76	Cielorraso en techo 2º	3 días												
77	Cielorraso en techo 3º	3 días												
78	Cielorraso en techo 4º	3 días												
79	Tabiquería	74 días												
80	Tabiquería de ladrillo	3 días												
81	Tabiquería de ladrillo	5 días												
82	Tabiquería de ladrillo	5 días												
83	Tabiquería de ladrillo	5 días												
84	Tabiquería de ladrillo	5 días												
85	Falsos pisos y contrapisos	73 días												
86	Falso piso en sótano	2 días												
87	Contrapiso en 1er. Pis	2 días												
88	Contrapiso en 2do. Pi	2 días												
89	Contrapiso en 3er. Pis	2 días												
90	Contrapiso en 4to. Pis	2 días												
91	Entubado eléctrico-sanitario	80 días												
92	IE+IS en sótano	1 día												

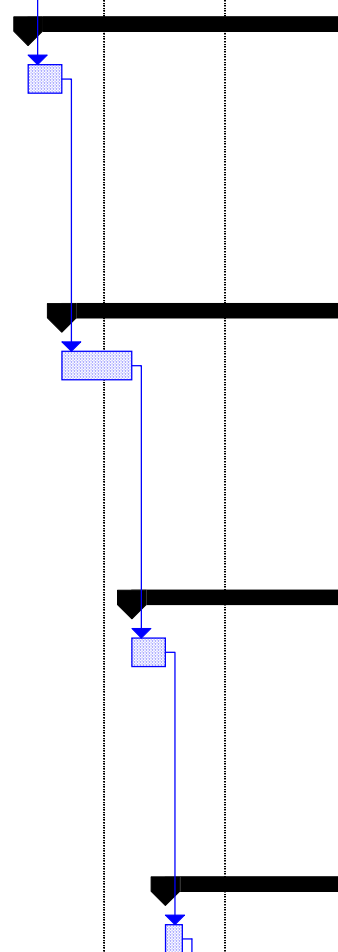

Proyecto: Cronograma de avance de c
Fecha: ma 25/01/05

Tarea		Resumen		Progreso resumido	
Tarea crítica		Tarea resumida		División	
Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas	
Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto	













Id	Nombre de tarea	Duración	04 abr '99	11 abr '99	18 abr '99	25 abr '99	02 may '99	09 may '99	16 may '99	23 may '99	30 may '99	06 jun '99	13 jun '99	20 jun '99
			04/04	11/04	18/04	25/04	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06	13/06	20/06
93	IE+IS en 1er. Piso	9 días												
94	IE+IS en 2do. Piso	9 días												
95	IE+IS en 3er. Piso	9 días												
96	IE+IS en 4to. Piso	9 días												
97	Cableado de alimentador	83 días												
98	Alimen.+ tableros en ε	1 día												
99	Alimen. + tableros en	4 días												
100	Alimen. + tableros en	4 días												
101	Alimen. + tableros en	4 días												
102	Alimen. + tableros en	4 días												
103	Revoques y enlucidos in	93 días												
104	Tarrajeo y solaqueo e	5 días												
105	Tarrajeo en 1er. Piso	11 días												
106	Tarrajeo en 2do. Piso	11 días												
107	Tarrajeo en 3er piso	11 días												
108	Tarrajeo en 4to. Piso	11 días												
109	Tarrajeo en tanque el	2 días												
110	Tarrajeo exterior	15 días												
111	Pisos	5 días												
112	Cobertura de ladrillo p	5 días												




Proyecto: Cronograma de avance de c
Fecha: ma 25/01/05

Tarea		Resumen		Progreso resumido	
Tarea crítica		Tarea resumida		División	
Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas	
Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto	


27 jun '99	04 jul '99	11 jul '99	18 jul '99	25 jul '99	01 ago '99	08 ago '99	15 ago '99	22 ago '99	29 ago '99	05 sep '99	12 sep '99	19 sep '99	26 sep '99	03 oct '99	10 oct '99	17 oct '99
27/06	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08	08/08	15/08	22/08	29/08	05/09	12/09	19/09	26/09	03/10	10/10	17/10

Proyecto: Cronograma de avance de c Fecha: ma 25/01/05	Tarea		Resumen		Progreso resumido	
	Tarea crítica		Tarea resumida		División	
	Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas	
	Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto	

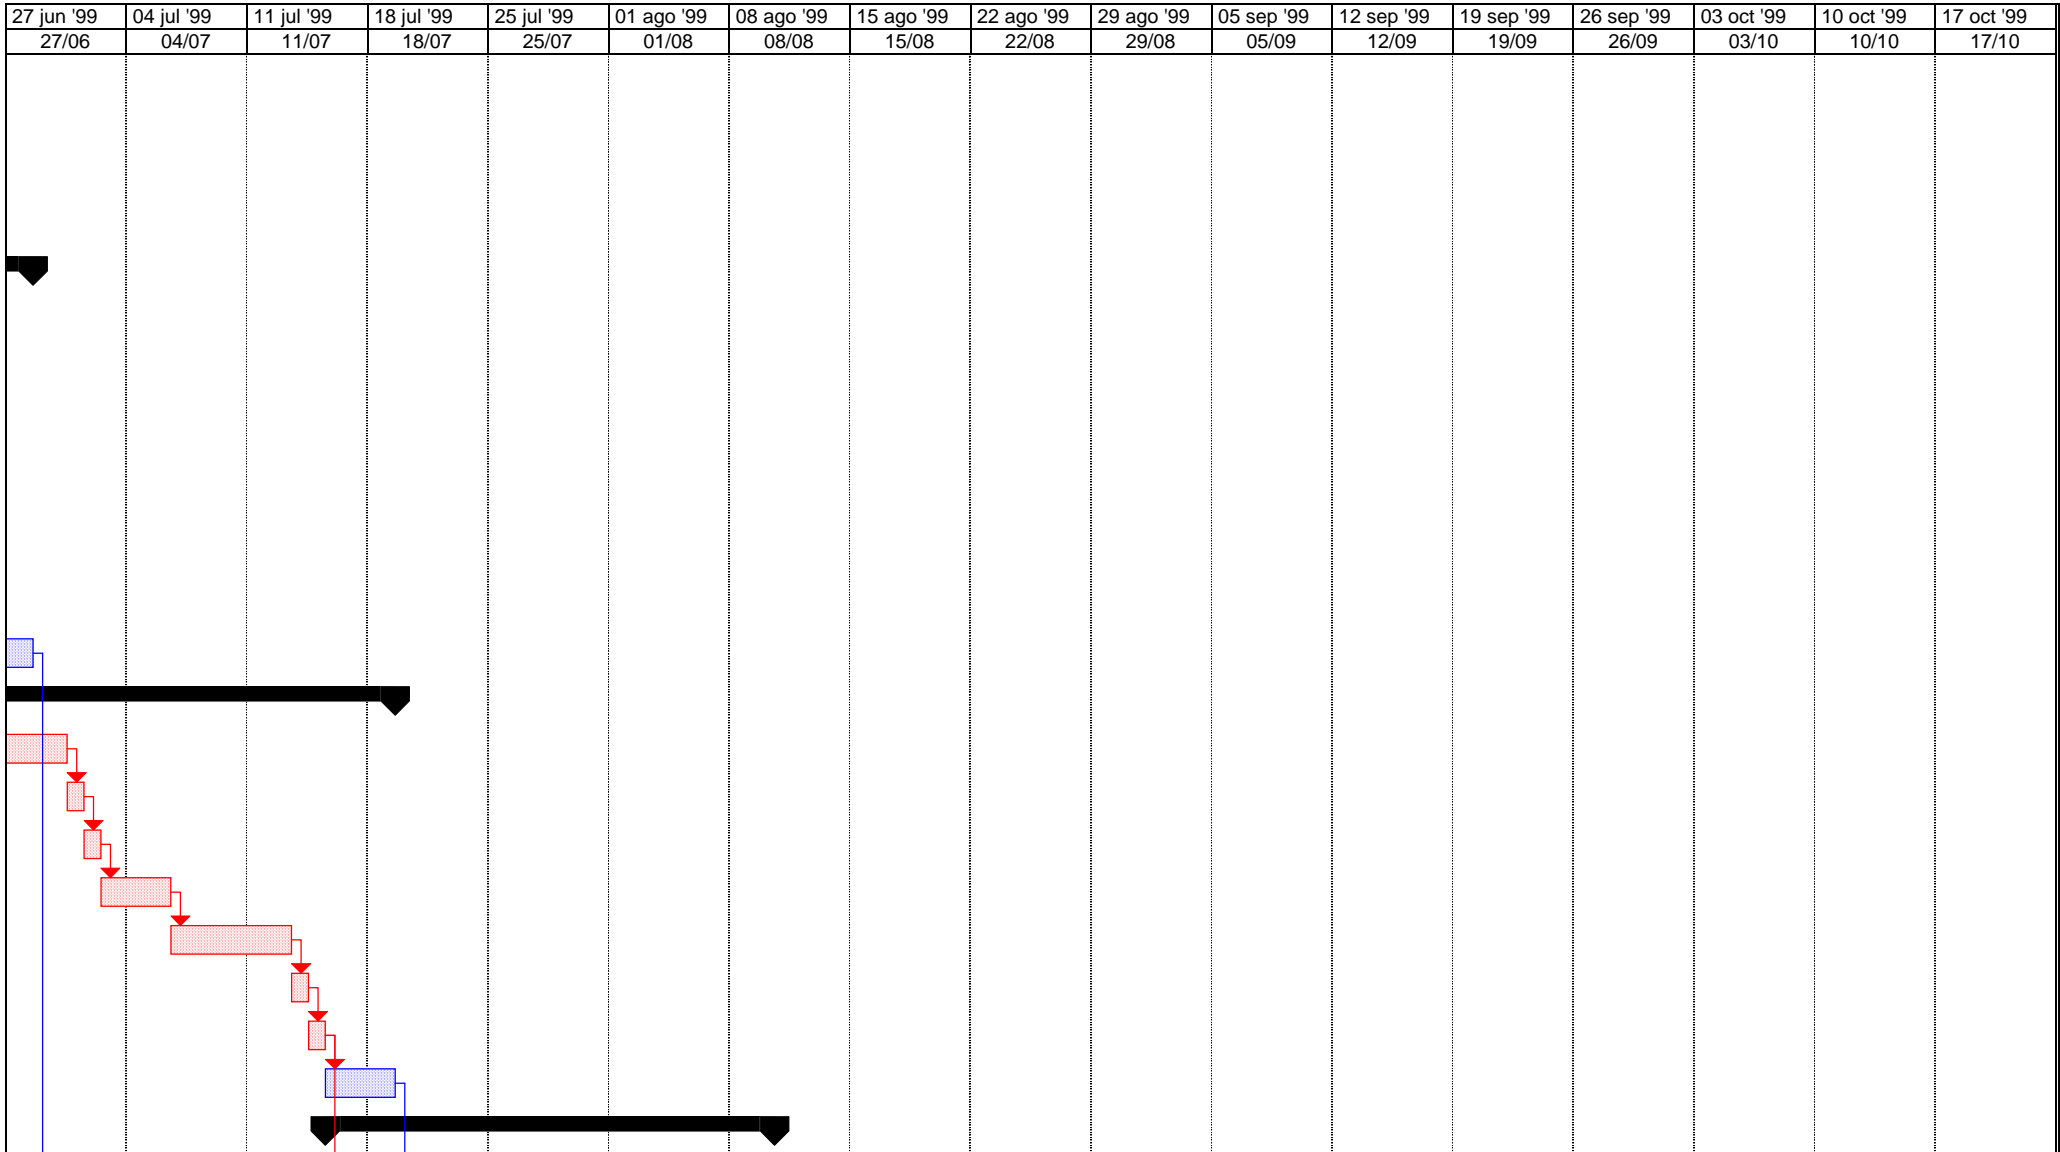


Proyecto: Cronograma de avance de c
 Fecha: ma 25/01/05

Tarea		Resumen		Progreso resumido	
Tarea crítica		Tarea resumida		División	
Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas	
Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto	

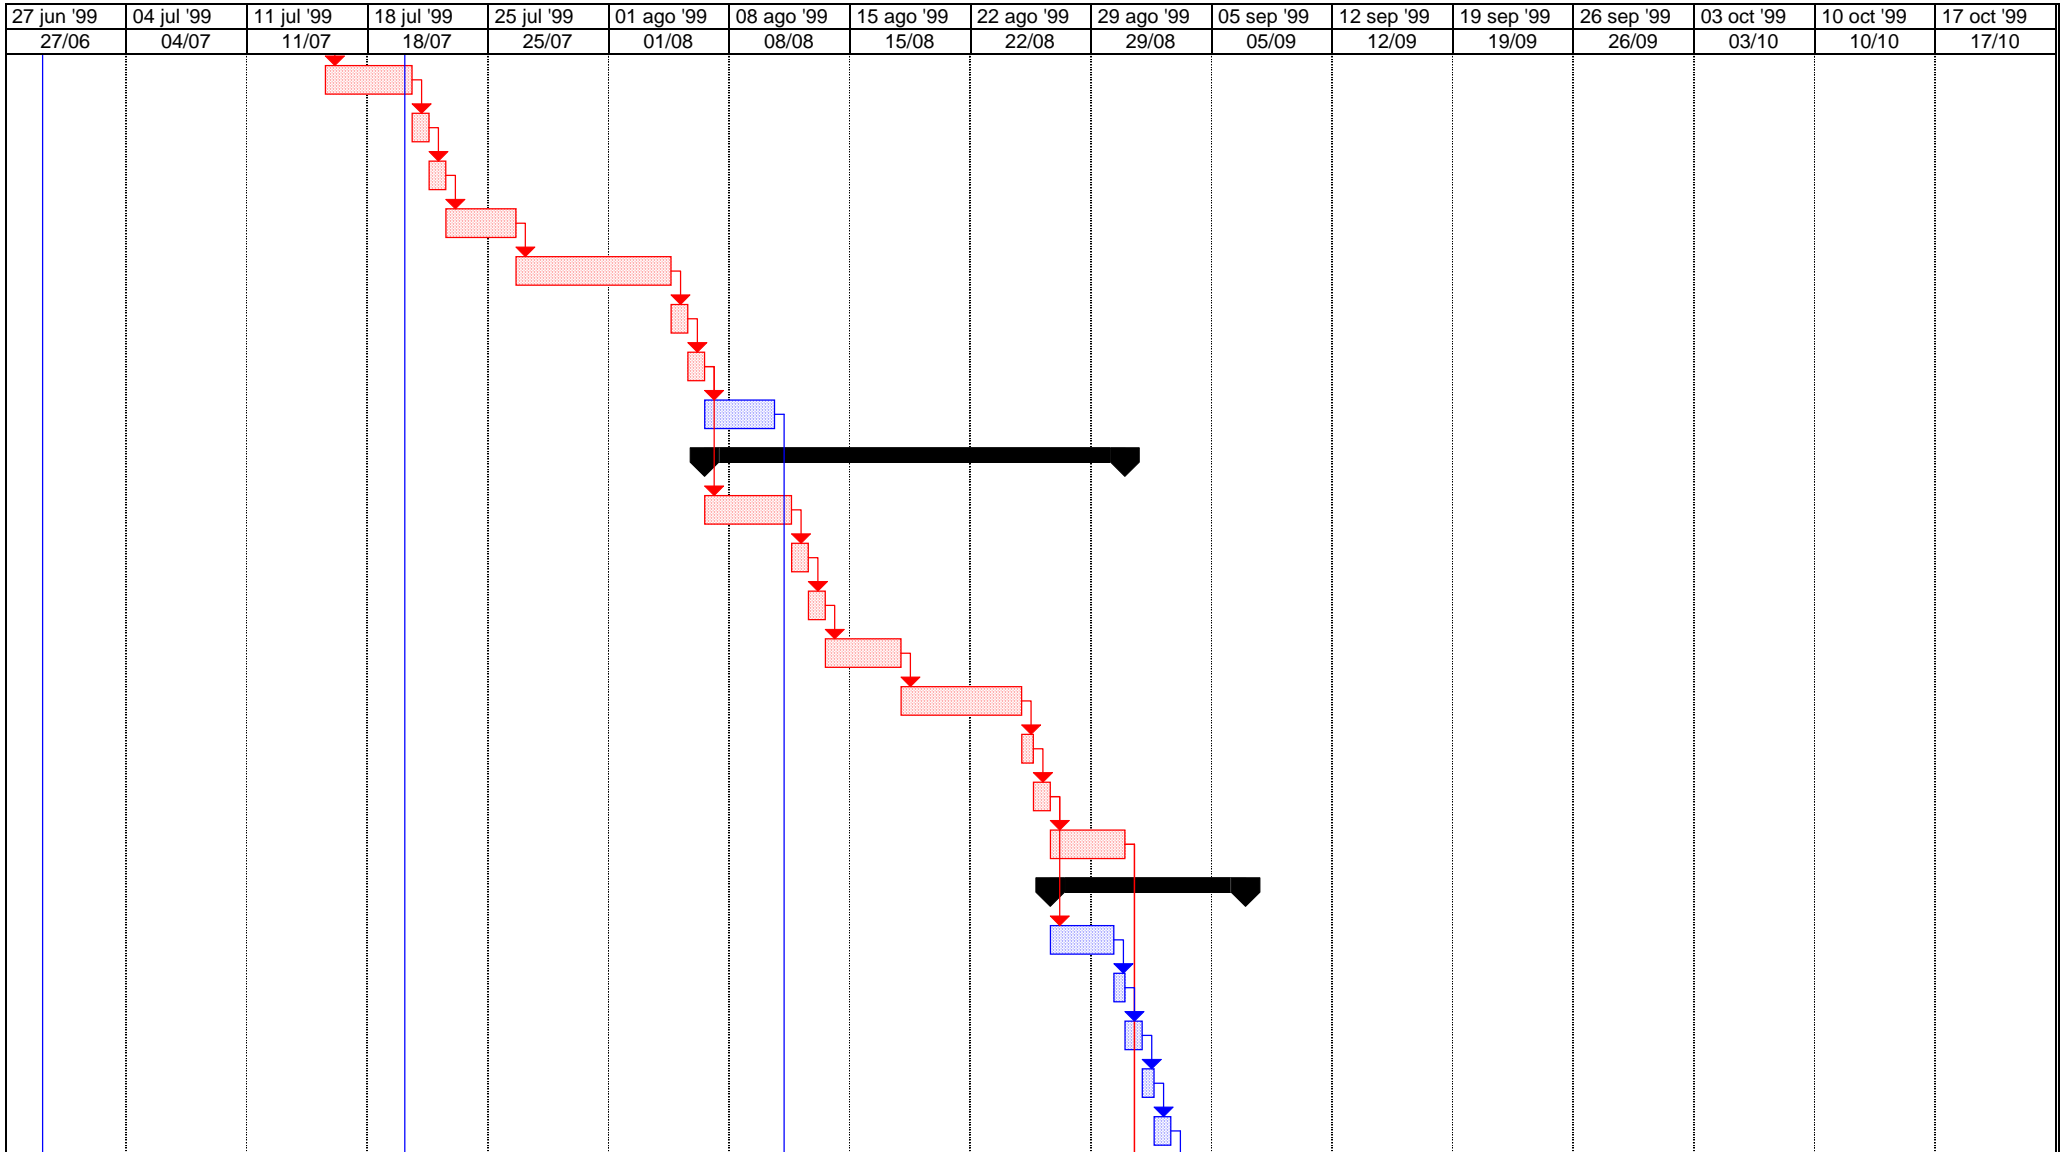

Proyecto: Cronograma de avance de c Fecha: ma 25/01/05	Tarea		Resumen		Progreso resumido	
	Tarea crítica		Tarea resumida		División	
	Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas	
	Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto	

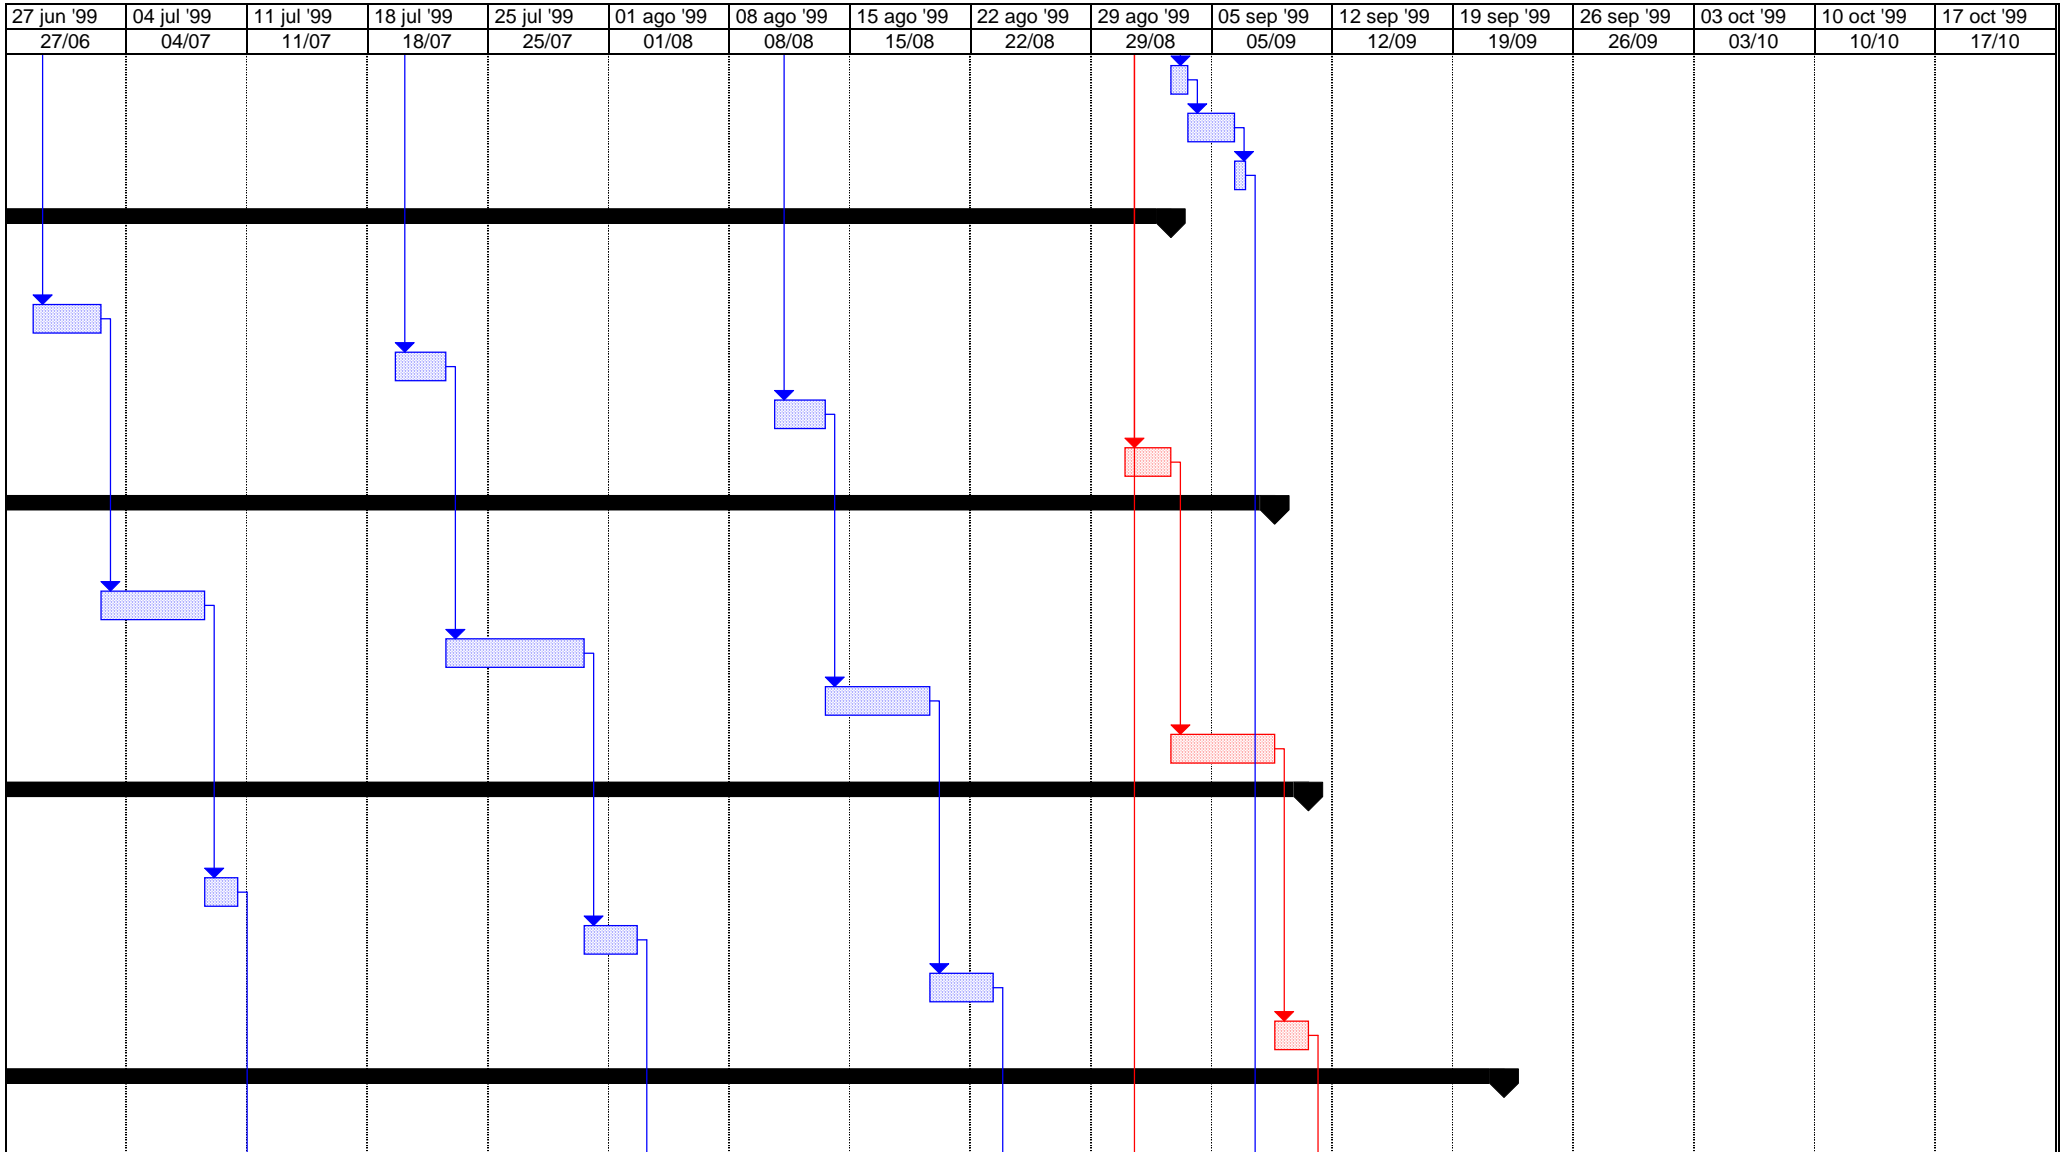

Proyecto: Cronograma de avance de c Fecha: ma 25/01/05	Tarea		Resumen		Progreso resumido	
	Tarea crítica		Tarea resumida		División	
	Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas	
	Hito		Hito resumido		Resumen del proyecto	

